

京都市左京区総合庁舎整備等事業 建築レポート



左京区
シンボルマーク

皆様、こんにちは、9月度の作業は、最上階（3階躯体）の型枠脱型作業を行いました。又、仕上工事も順調に進み、B1・1階では間仕切り壁や天井のボード貼り、天井の下地組立て、2階では先行設備配管、配線工事、サッシの取付け工事などを行いました。
10月度も引き続きB1～3階の仕上工事を進めていく為、大型車輛は少なくなりますが、資材の搬入車輛が多く出入りします。
ご迷惑をお掛けしますが、細心の注意を払い安全最優先で工事を進めて参りますので、皆さまのご理解、ご協力よろしくお願いいたします。
今月は、各階の現在の工事の進捗状況を写真にてお知らせいたします。

3階内部

最上階（3階）では、型枠の解体、搬出が完了し、天井下地の鉄骨の取り付け工事と仕上工事の準備をしています。



1階内部

1階では、間仕切り壁、天井の下地工事、外壁の吹き付け下地補修を行っています。




B1階内部

B1階では、間仕切り壁、天井のボード貼り、機械室の壁ガラスウール貼り、ドライエリア外壁の吹き付け下地補修等を行っています。



完成予想パース

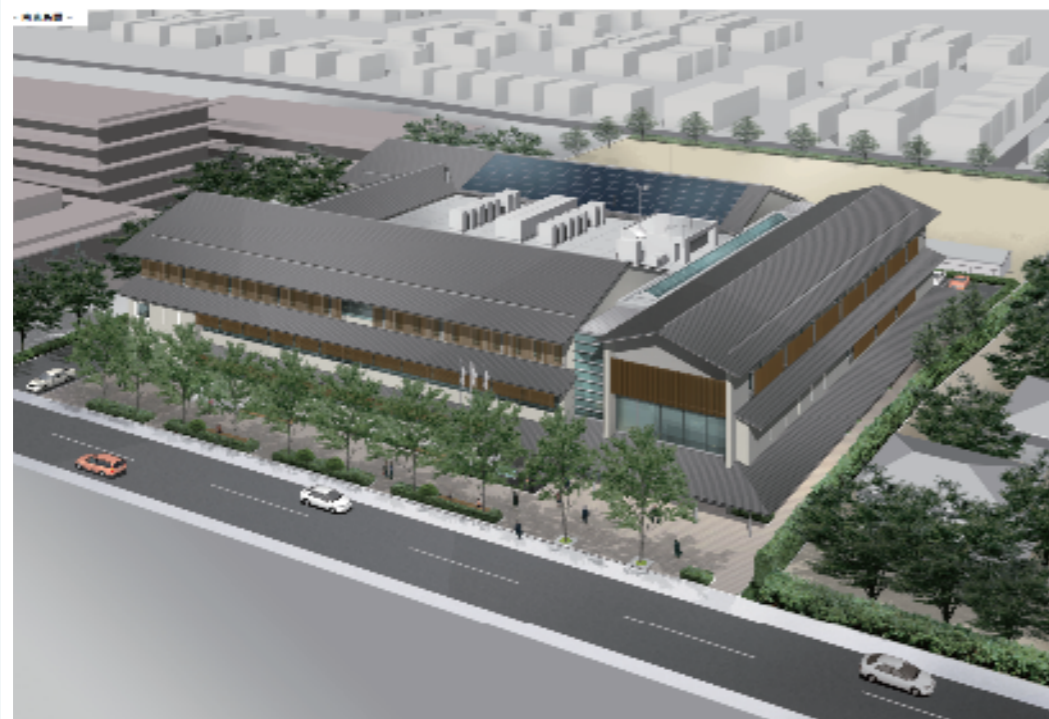

2階内部

2階では、サッシの取り付け、天井内設備配管、配線工事を行っています。

